
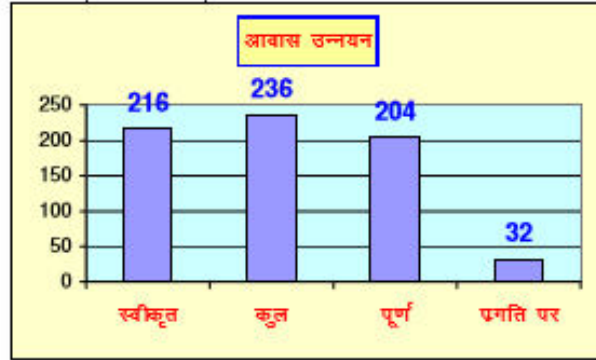


इंदिरा आवास योजना

भौतिक स्थिति

							मार्च 2010	
क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष हेतु लक्ष्य	गतवर्ष की अपूर्ण कुटीरें	स्वीकृत	कुल	पूर्ण	प्रगति पर	प्रतिशत
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	आवास निर्माण	0	45	834	879	529	350	60.18%
2	आवास उन्नयन	0	20	216	236	204	32	86.44%

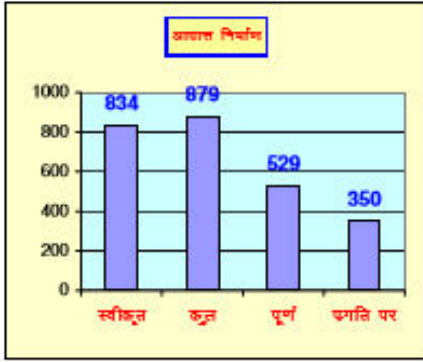

वित्तीय स्थिति

क्र.	विवरण	प्रथम चरण हेतु लक्ष्य	कुल उपलब्ध आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1	आवास निर्माण	0	225.070	218.32	97%
2	आवास उन्नयन	0	32.69	32.00	98%

