


इंदिरा आवास योजना

भौतिक स्थिति

भौतिक स्थिति							नवम्बर 2012	
क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष हेतु लक्ष्य	गतवर्ष की अपूर्ण कुटीरें	स्वीकृत	कुल	पूर्ण	प्रगति पर	प्रतिशत
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	आवास निर्माण	693	122	689	811	110	701	14%

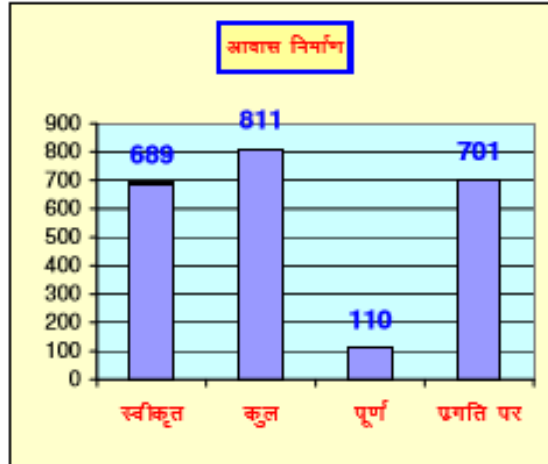

वित्तीय स्थिति

क्र.	विवरण	लक्ष्य	कुल उपलब्ध आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1	आवास निर्माण	693	204.00	173.03	85%
