


जलामिषेक अभियान वर्ष 2012-13

जल संरक्षण और संबंधित कार्यों की प्रगति माह नवम्बर २०१२

क्र०	कार्यों का नाम	कार्य योजना			चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से रिपोर्टिंग माह के अंत तक प्रगति		
			प्रस्तावित कार्यों की मात्रा/ परिमाण इकाई	प्रस्तावित कार्यों की लागत (रु. लाख में)	पूर्ण कार्यों की मात्रा/ परिमाण	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (रु. लाख में)	व्यय राशि में जनसहयोग (रु. लाख में)
1	कंदूर ट्रेच	र मीटर	5000	7.50	5000	7.50	0.00
2	कंदूर बोल्टर पॉल	र मीटर	-	-	-	-	-
3	शासकीय भूमि पर कंदूर बंद तथा निजी भूमि पर मेड़ बंधान	र मीटर	71465	121.72	19224	56.15	5.65
	उपयोग		76465	129.22	24224	63.65	5.65
4	गली प्लग	संख्या	51	9.18	87	8.96	1.72
5	सोक पिट	संख्या	337	27.03	118	3.15	2.84
6	भूमिगत डाइक	संख्या			-	-	-
7	कुओं का रिचार्ज	संख्या	300	17.00	300	16.00	4.00
8	हैण्डपंप/ नलकूपों का रिचार्ज	संख्या	69	7.25	35	3.95	0.76
9	फार्म पौण्ड/ सिंचाई खेत तालाब	संख्या	40	73.30	25	46.65	25.33
10	मिटटी व बोल्टर के नाला बंधान / चेक डेम/ ग्रबियन संरचना	संख्या	1	1.50	2	0.71	0.71
11	सीमेंट/ कांक्रीट के चेक डेम/स्टाप डेम/ ड्राप स्पिल-वे	संख्या	109	166.79	28	86.18	6.2

12	बोरी बांधान	संख्या	30	2.63	2	0.09	0.04
13	तालाब	संख्या	74	153.10	56	169.08	38.98
14	परकोलेशन तालाब	संख्या	-	-	-	-	-
15	रूफ वाटर हार्वेस्टिंग	संख्या	-	-	-	-	-
16	पुराने तालाबांधान/चेक डेम/स्टाप डेम का सुधार/ पुनरोद्धार	संख्या	93	121.40	47	47.13	11.60
17	पुराने तालाबों का सुधार/जीर्णोद्धार	संख्या	127	223.09	117	127.55	81.93
18	पुरानी बाघड़ी/कुओं की जीर्णोद्धार सफाई/नवीन कूप निर्माण	संख्या	54	72.82	16	18.91	10.70
19	अन्य कोई कार्य (नाम पूर्ण विवरण सहित) नदी से गाढ		5	10.65	12	16.07	15.92
20	भागीस्थ कृषकों के कार्य	संख्या	116	140.00	79	115.20	80.49
21	नदी पुर्नजीवित हेतु जनपद स्तर पर कार्य	संख्या	66	96.2	59	118.05	107.23
	योग :-		1472	1121.94	983	777.68	388.45
	जल संरक्षण एवं संवर्धन का योग			1251.16		841.33	394.1
20	वृक्षारोपण	हेक्टेयर					
	महायोग:-						

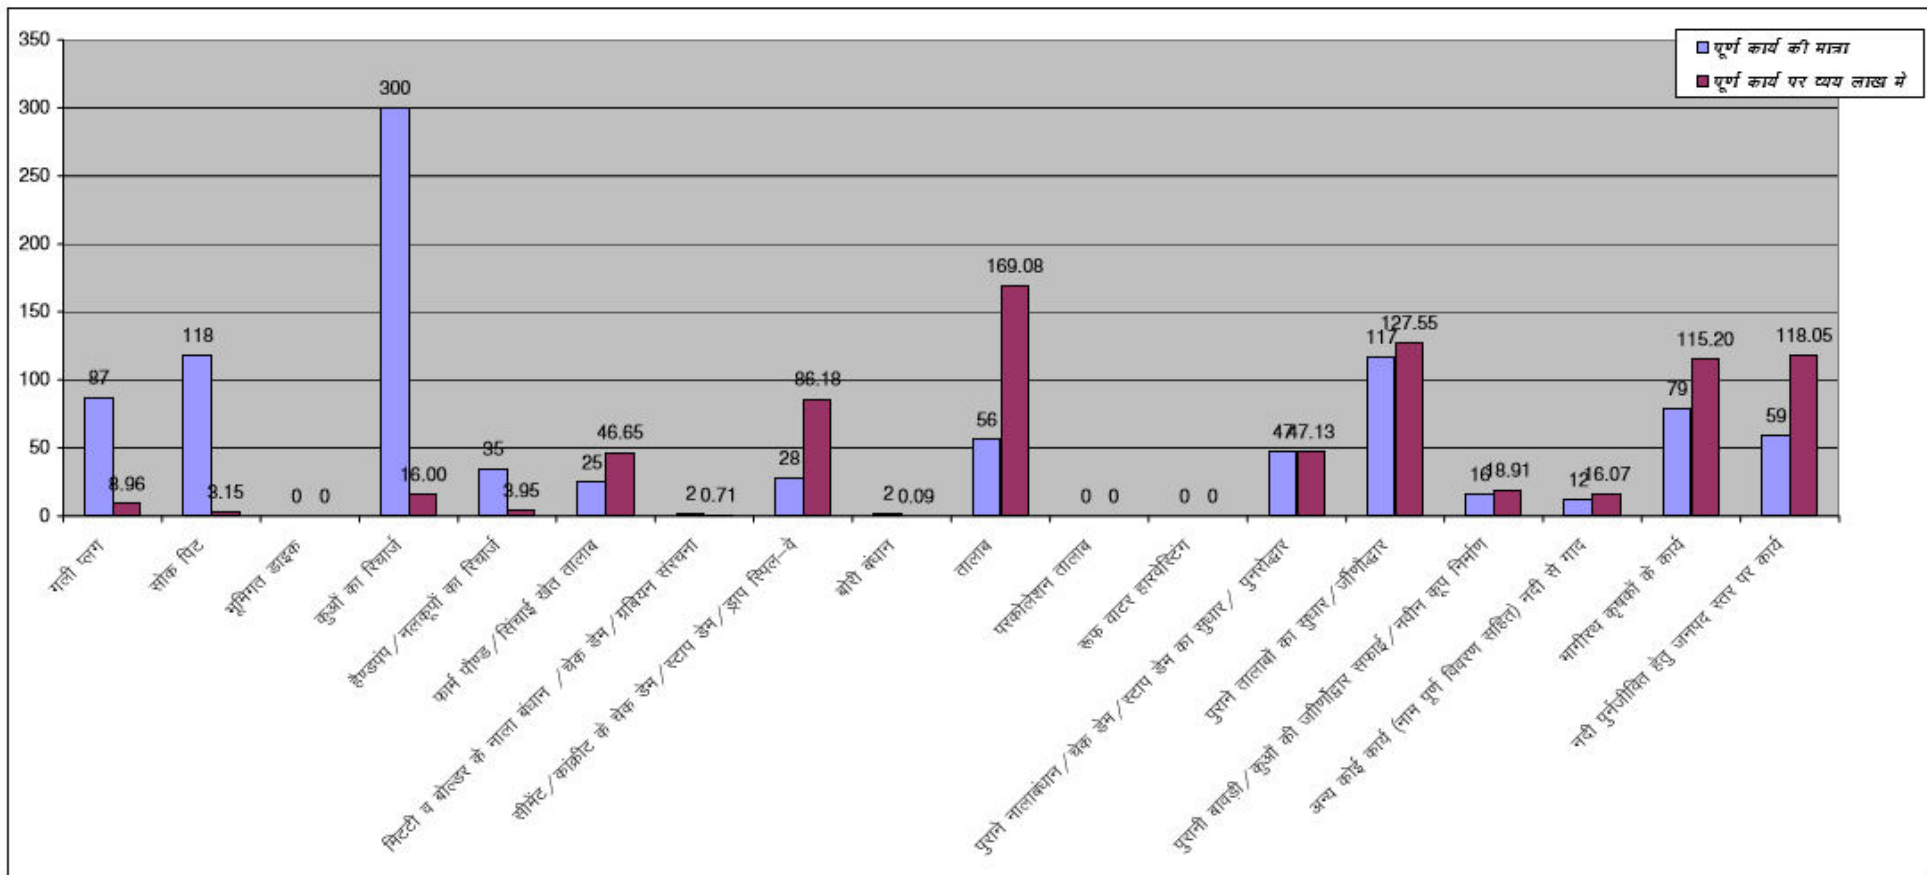

“हरियाली – महोत्सव” 2012-13

01 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2013 तक (माह नवम्बर 2012)

क्र.	विकास खण्ड का नाम	रोपित किया गया कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये गये पौधों की प्रजातिवार संख्या (लाख में)					कुल
			उद्यानिकी प्रजाति (जैसे : अमरुद, जामून, अनार, सीताफल, आम, कटहल, आंवला, मुनगा, इमली, करौंदा, बेर, नीबू, संतरा, मौसम्बी इत्यादि)	जलारू लकड़ी की प्रजाति (जैसे : सूबबूल, सीरस, बबूल, अंजन इत्यादि)	ईमारती लकड़ी की प्रजाति (जैसे: सागौन, शीशम इत्यादि)	व्यापारिक उत्पादन की प्रजाति (जैसे : बांस, अगस्त, सहजन, यूकेलिप्टस, महुआ, करंज, खम्हार इत्यादि)	शोभादार एवं छायादार प्रजाति (जैसे : बरगद, पीपल, कदंब, कचनार, अशोक, बॉटल ब्रश, अमलतास, महोगनी, गुलमोहर इत्यादि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इन्दौर	73.500	0.120	0.030	0.031	0.130	0.130	0.441
2	महू	38.500	0.070	0.001	0.005	0.085	0.070	0.231
3	सांवेर	75.000	0.090	0.030	0.200	0.080	0.050	0.450
4	देपालपुर	87.000	0.209	0.060	0.015	0.072	0.166	0.522
	योग	274.000	0.489	0.121	0.251	0.367	0.416	1.644
5	अन्य विभाग	1415.500	0.640	2.622	2.250	1.200	1.804	8.516
	महायोग	1689.500	1.129	2.743	2.501	1.567	2.220	10.160

स्टापडेम जीर्णोद्धार एवं बोरी बंधान (जल अभिषेक अभियान अंतर्गत)

कार्य योजना वर्ष 2012-13 माह मई 2013 अंत तक (माह नवम्बर 2012)

म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों में पानी के उपलब्ध प्रवाह को यथासंभव रोककर जल संग्रहण किये जाने बाबद् मानसून सत्र समाप्ति पश्चात् स्टापडेम जीर्णोद्धार कड़ी शटर लगाने एवं बोरी बंधान का समयबद्ध कार्यक्रम देने पर निम्नानुसार प्रगति :-

क्र.	विकास खंड का नाम	स्टापडेम जीर्णोद्धार		कड़ी शटर कार्य		बोरी बंधान कार्य	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	इन्दौर	14	12.13	-	-	2	0.09
2	महु	33	40.00	-	-	0	0.00
3	सांवेर	0	0.00	-	-	-	0.00
4	देपालपुर	0	0.00	-	-	-	0.00
	योग	47	52.13	0	0.00	2	0.09
